مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الأدارة العامه للتنفيذ و الأشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز — رقم المخطط :BLOCK03 — رقم الشارع : ROAD 03 — عرض الشارع: 18

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE — 125+0 — الى محطة رقم :264.28

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع : — التاريخ : 4/11/2024 0:00

☐ المراقب — ☐ المساح — ☐ المختبر — توقيع المهندس المشرف :...........

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : 125+00 — الي المحطه : 264+00

من المحطه : .... — الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي — ☐ القطاع العرضي — ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... — التوقيع: — التاريخ : / /

من محطة : — الى محطة :

توقيع المساح : — التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد — ☐ مرفق — ☐ غير مرفق — قيمه البركتور : — الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات

النتيجه : ☐ ناجح — ☐ راسب — التوقيع : .... — التاريخ : / /

ملاحظات — ارفاق نتائج اختبارات الرمل

تعليمات المهندس الاستشاري :

☐ موافق — ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... — مندوب المقاول : .... — التوقيع : .... — التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتواصل : مدير المشاريع 0544714479 الإدارة 0566157166 info@ramakcompany.com



أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق			المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				
تقـــرير إســـتلام طــبقــة ردم											
ROAD-B03-3	رقم الشارع :-				تلال الغروب		إسم المشروع :-				
264.28M	طول الشارع :-				BLOCK03		رقم المخطط :-				
18	عرض الشارع :-				BOUTTOM OF SUPGRADE-1		رقم الطبقة :-				
	WIDHT-R	9.000			LAYAER THICKNESS			0.150			
	WIDHT-L	9.000			DEOTH FROM TOP SUB.G			0.000			

PVI	Station	Easting	Northing	L	L	C.L	R	R	CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%			
				-5.000	-3.500	0.000	3.500	5.500			
11	125	530193.228	2369289.807	59.584	59.502	59.554	59.502	59.584	9.000	9.000	0.079
12	137.5	530204.769	2369285.005	59.739	59.657	59.709	59.657	59.739	9.000	9.000	0.109
13	150	530216.31	2369280.203	59.893	59.811	59.863	59.811	59.893	9.000	9.000	0.138
14	162.5	530227.85	2369275.4	60.048	59.966	60.018	59.966	60.048	9.000	9.000	0.167
15	175	530239.391	2369270.598	60.203	60.121	60.173	60.121	60.203	9.000	9.000	0.197
16	187.5	530250.932	2369265.796	60.357	60.275	60.327	60.275	60.357	9.000	9.000	0.226
17	200	530262.472	2369260.993	60.512	60.430	60.482	60.430	60.512	9.000	9.000	0.256
18	212.5	530274.013	2369256.191	60.667	60.585	60.637	60.585	60.667	9.000	9.000	0.286
19	225	530285.554	2369251.388	60.822	60.740	60.792	60.740	60.822	9.000	9.000	0.205
20	237.5	530297.094	2369246.586	60.968	60.886	60.938	60.886	60.968	9.000	9.000	0.039
21	250	530308.635	2369241.784	61.094	61.012	61.064	61.012	61.094	9.000	9.000	-0.146
22	262.5	530320.176	2369236.981	61.213	61.131	61.183	61.131	61.213	9.000	9.000	-0.319
23	264.28	530321.82	2369236.297	61.230	61.148	61.200	61.148	61.230	9.000	9.000	-0.343

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد التوقيع :- التاريخ :-		الإسم :- التوقيع :- التاريخ :-

مشاريع البنية التحتية

(1010294003)
مخطط تلال الغروب - جدة
بلوكات رقم
(13-12-11-10-5-3-1)
RIYADH ROADS CONTRACTING

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.74
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	04-11-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st Layer of Sub Base
Location	Block 03 Road 03 Sta. 0+125 to Sta. 0+264

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+150	2.352	2.180	7.9	99.5	
2	0+190	2.351	2.185	7.6	99.7	
3	0+150	2.331	2.170	7.4	99.1	

M.D.D	=	2.191 kg/m3
O.M.C	=	7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client.


** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Cheked by

Approved by

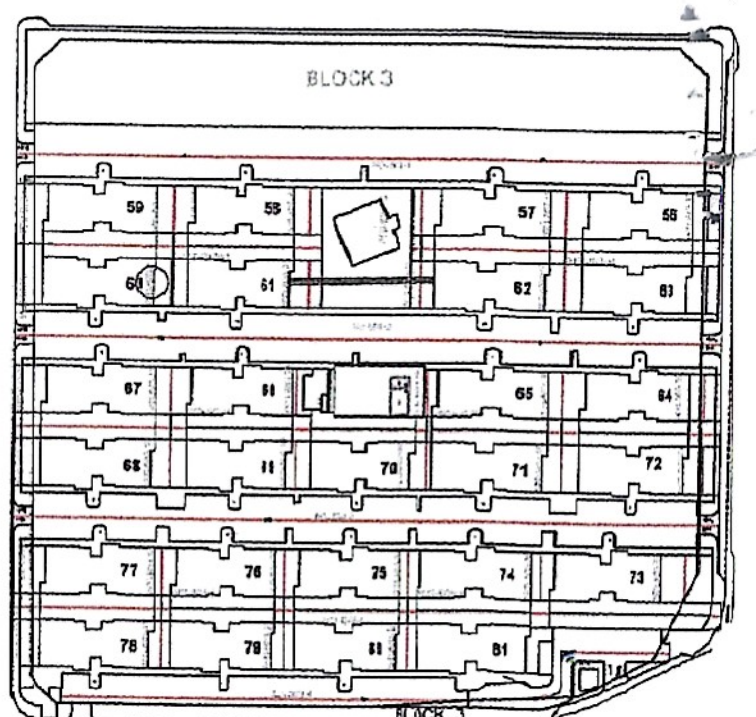

اتجاة تصريف المياة

الارض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق بالادارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام/ الابنية للاستشارات الهندسية

Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:
مقياس الرسم:

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق

BLOCK 3

RO-B03-1

RO-B03-2

RO-B03-3

RO-B03-4

PED-B03-A1

PED-B03-2

PED-B03-3
